



**REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA di TORINO
COMUNE di SCALENGHE**

PROGETTO ESECUTIVO

**Oggetto: Comune di Scalenghe
Completamento dei lavori di regimazione acque a protezione dell'abitato
(tratto via Santa Caterina - strada Barattina)
CIG 67848760CD - CUP F78G11000200006**

CRONOPROGRAMMA

Rev.	Data	Redazione	Verifica	Autorizzazione	Modifiche
2	Settembre 2016				

	Il Progettista: Benedetto ing. Giovanni, via Madonna del Rosario 5 – 10019 – Strambino tel/fax 0125 713367 cell. 339 7021999 e-mail giovanbenedetto@gmail.com www.studiobenedetto.com	
	Allegato n.	Elaborato n. 03

NB:

1. Le date del cronoprogramma sono indicative e da definirsi con l'aggiudicazione dei lavori.
2. Secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto :entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione , deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori.
3. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	4	5	28/04/2014	02/05/2014
Movimenti di materia						
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	E	5	5	05/05/2014	09/05/2014
	1	E	2	2	28/08/2014	29/08/2014
Scavo a sezione ristretta	1	E	11	15	12/05/2014	26/05/2014
	1	E	2	2	01/09/2014	02/09/2014
Protezione delle pareti di scavo	1	E	10	15	27/05/2014	10/06/2014
	1	E	5	7	03/09/2014	09/09/2014
Rinterro di scavo	1	E	11	15	16/07/2014	30/07/2014
	1	E	2	2	16/10/2014	17/10/2014
Formazione di fondazione stradale	1	E	11	15	31/07/2014	14/08/2014
	1	E	2	2	20/10/2014	21/10/2014
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	5	5	18/08/2014	22/08/2014
	1	E	2	2	22/10/2014	23/10/2014
Opere idrauliche						
Posa di condotta fognaria in conglomerato cementizio (giunto ad incastro)	1	E	25	35	11/06/2014	15/07/2014
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1	E	3	3	25/08/2014	27/08/2014
Opere in cemento armato						
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.	1	E	8	10	10/09/2014	19/09/2014
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.	1	E	8	10	22/09/2014	01/10/2014
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	1	E	10	14	02/10/2014	15/10/2014
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	24/10/2014	24/10/2014

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA


I = IMPRESA


Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

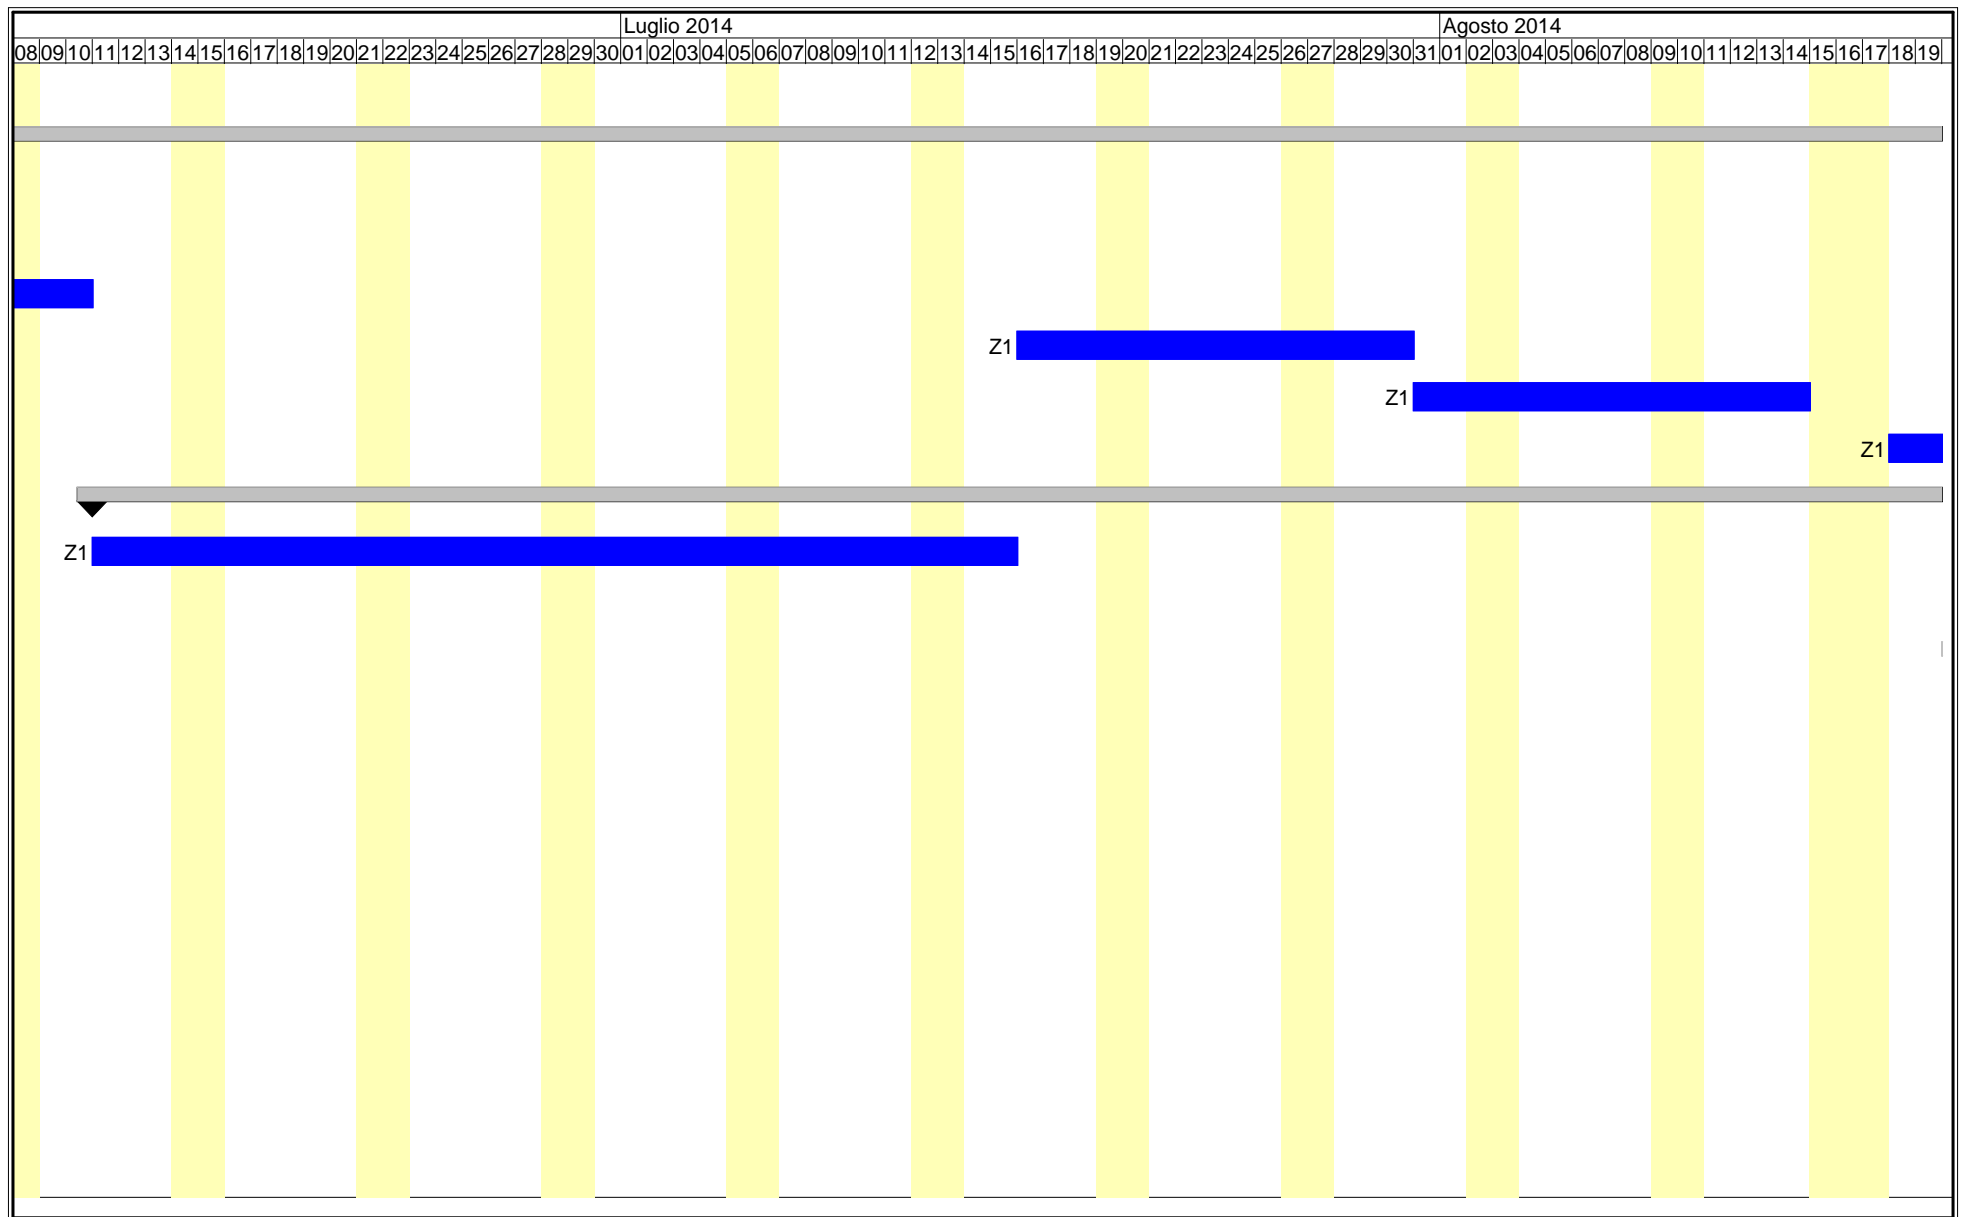

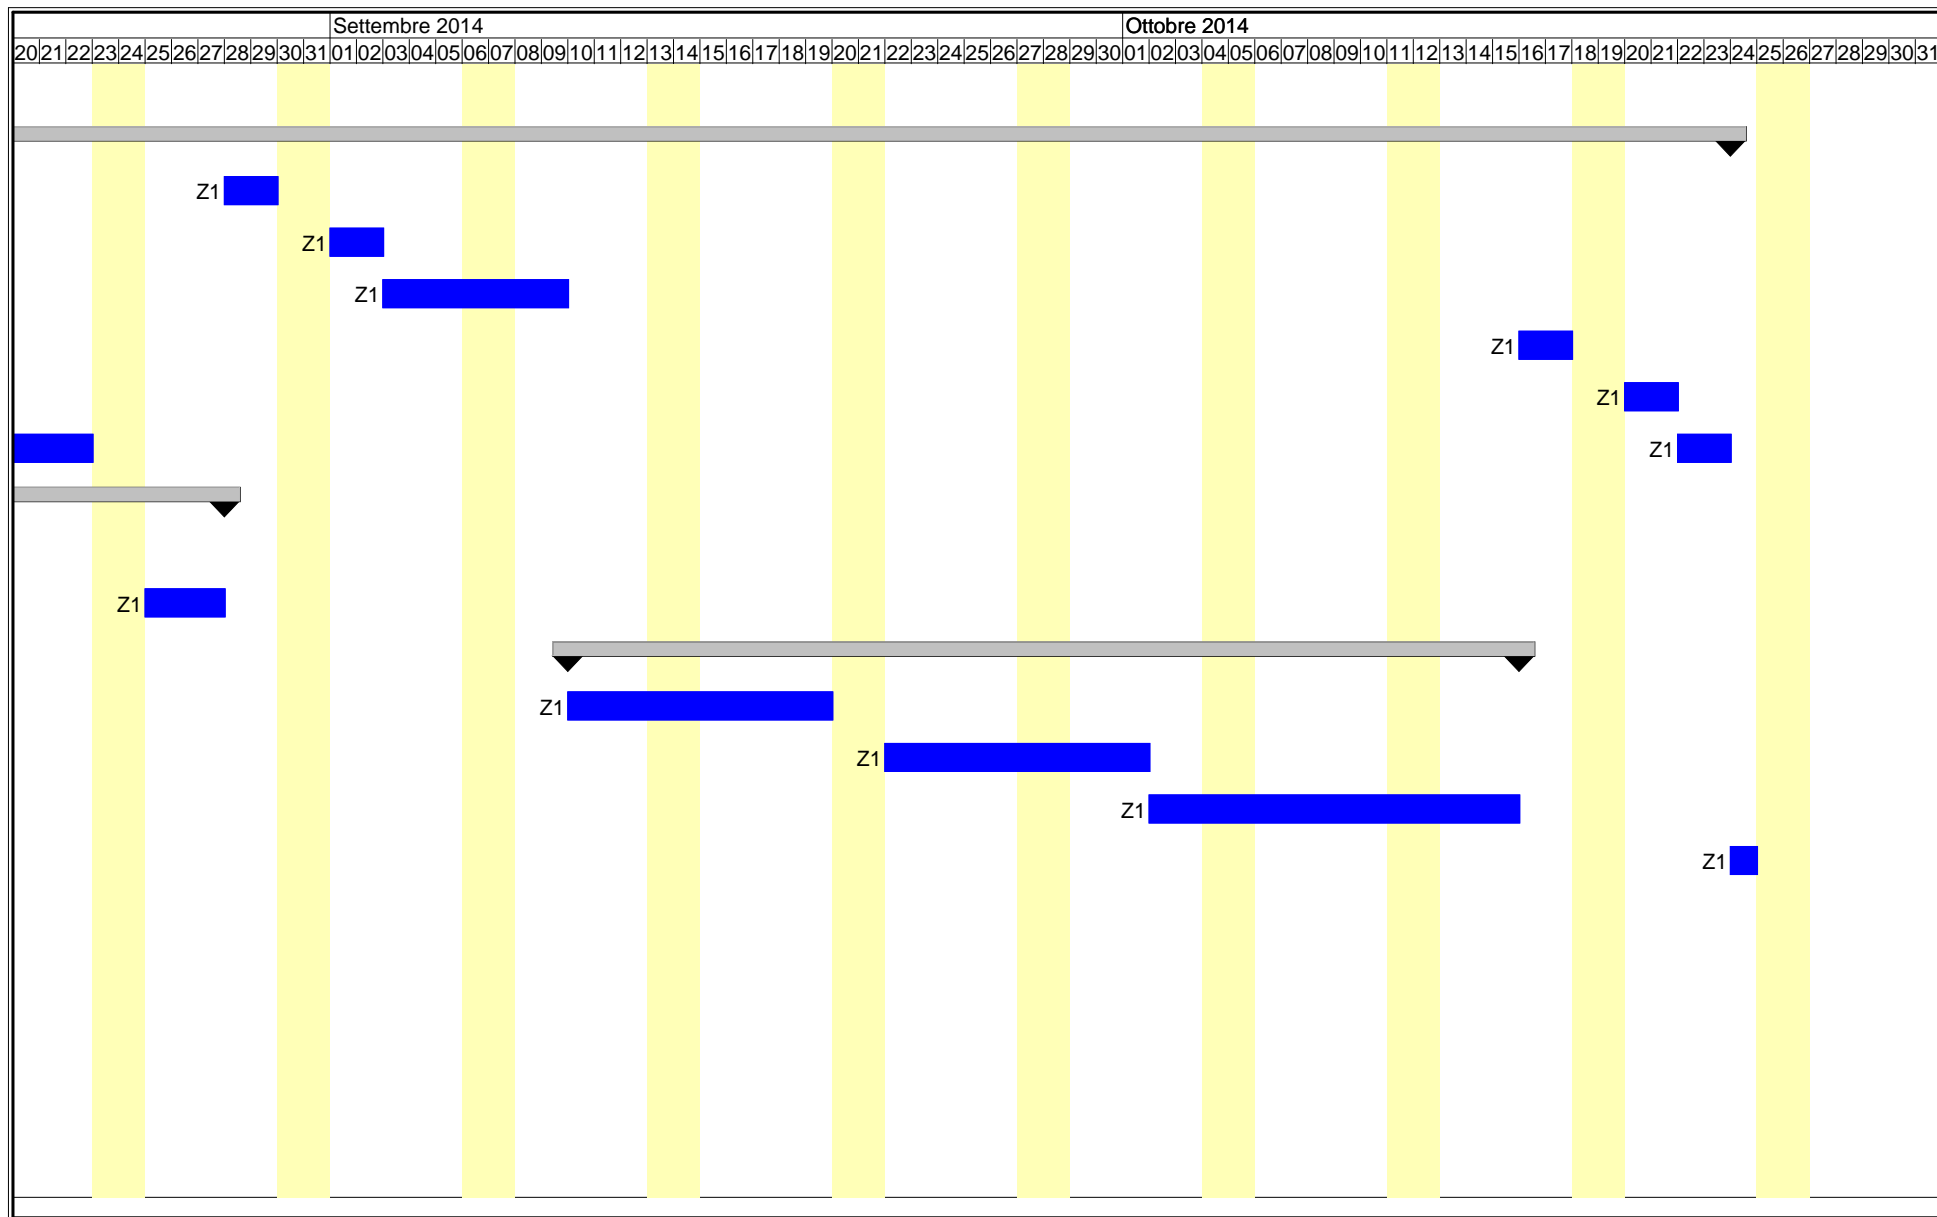



**REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA di TORINO
COMUNE di SCALENGHE**

PROGETTO ESECUTIVO

**Oggetto: Comune di Scalenghe
Completamento dei lavori di regimazione acque a protezione dell'abitato
(tratto via Santa Caterina - strada Barattina)
CIG 67848760CD - CUP F78G11000200006**

CRONOPROGRAMMA

Rev.	Data	Redazione	Verifica	Autorizzazione	Modifiche
2	Settembre 2016				

Il Progettista:

Benedetto ing. Giovanni,
via Madonna del Rosario 5 –
10019 – Strambino
tel/fax 0125 713367
cell. 339 7021999
e-mail
giovanbenedetto@gmail.com
www.studiobenedetto.com

Allegato n.

Elaborato n.

03
